

INFORME GERENCIAL



Periodo del informe 27-08-2020 al 09-09-2020

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					
Nombre del proyecto	Locos por el Ecoturismo				
Cliente del proyecto	Carlos Andrés Parra Acevedo				
Nombre del gerente del proyecto	Carlos Arturo Merchán H.				

DECISIONES IMPORTANTES

1. Requerimientos y Calidad:

- El equipo de trabajo ha participado activamente en las actividades programadas.
- Se realizó una revisión de requerimientos y se ajustó el alcance del proyecto enfocados en generar la primera entrega comprometida:
 El tema de Google tag mánager se retiró de listado de requisitos no funcionales y se consideró como un requisito funcional de integración, pero por temas de alcance, como es relacionado con la línea de reportes, no se realizará.

2. Arquitectura

- El diagrama de componentes debe incluir las interfaces correspondientes e incluir una descripción.
- Se acordó tener un componente en la capa de negocio para acceso a la capa de datos y contemplar un componente tipo file system para referenciar las imágenes asociadas a los sitios.

3. Diseño

- El tratamiento de datos se considerará como una tarea dentro del caso de uso de autenticación
- Para el pago de la reserva se va a simular dicho proceso para poder generar la notificación vía e-mail
- El manejo de roles no va a quedar en la capa de presentación, pero si en la capa de negocio y datos.
- Se mapearon las historias con los componentes para validar que todas estén cubiertas


4. Herramientas para la implementación

- Se definió el motor de base de datos PostgreSql 9.6
- Interfaces REST y componentes SpringBoot
- Persistencia JPA e Hibernate



INFORME GERENCIAL



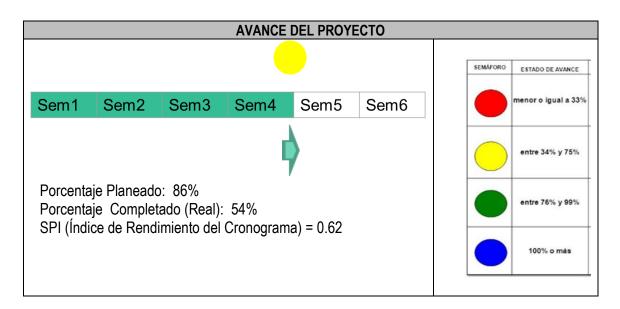

ANALISIS DEL INDICADOR Y PLAN DE ACCION

SPI 0.62 indica un atraso en el proyecto debido al aplazamiento de construcción de algunas funcionalidades que no fueron priorizadas para la primera entrega. Para recuperar el atraso se hizo un compromiso con el equipo de trabajo de redistribución de algunas actividades que nos permitirán recuperar el atraso en 10 días.

ANALISIS DE RIESGOS					
Categoría	Tipo Riesgo	Causa	Riesgo	Consecuencia de la materialización	
GERENCIA DEL PROYECTO	N	Planeación deficiente	Mala definición del cronograma (Subestimación de actividades)	Retraso en la ejecución	
GERENCIA DEL PROYECTO	N	Planeación de esfuerzo no se ajusta a la realidad del proyecto	Esfuerzo estimado no cubre la necesidad para todo el proyecto	Sobrecarga de esfuerzo para la ejecución del proyecto	
TECNICA	N	Que la solución no cumpla las expectativas del cliente	Que no tenga la aceptación esperada	Pérdida de recursos invertidos en la construcción del prototipo	

RELACIÓN DE ACTAS			
Acta 06 del 31 de agosto - Primera entrega			
Acta 07 del 3 de septiembre			
Acta 08 del 6 de septiembre			

ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA DE APROBACION
LUZ EDITH GONZALEZ	CARLOS ARTURO MERCHAN	10-09-2020
